


Id.		Nazwa zadania	Cz. trw.	Rozp.	Zak.	Poprze	Nazwy zasobów	a
1		SITBB_KIOSKI - Oprogramowanie	170 dn	Pią, 06-10-06	Czw, 07-05-31		SP Bielsko-Biała	
2		Przetarg2	23 dn	Pią, 06-10-06	Wto, 06-11-07		SP Bielsko-Biała	
3		Przetarg2 rozstrzygnięcie, umowa	10 dn	Wto, 06-11-07	Pon, 06-11-20		SP Bielsko-Biała	
4		Przetarg2 - I etap	68 dn	Pon, 06-11-20	Śro, 07-02-21		Dostawca oprogramowania	
5		Dokumentacja, Oprogramowanie administracyjne, Hosting, Testy	68 dn	Pon, 06-11-20	Śro, 07-02-21		Dostawca oprogramowania	
6		Specyfikacja techniczna i funkcjonalna (W1)	10 dn	Pon, 06-11-20	Pią, 06-12-01		Dostawca oprogramowania	
7		Specyfikacja techniczna i funkcjonalna (W2), Plan testów (W1)	5 dn	Pon, 06-12-04	Pią, 06-12-08	6	Dostawca oprogramowania	
8		Plan Testów (W2)	5 dn	Pon, 06-12-11	Pią, 06-12-15	7	Dostawca oprogramowania	
9		Prototyp aplikacji administracyjnej, dostarczenie usług hostingowych	15 dn	Pon, 06-12-18	Pią, 07-01-05	8	Dostawca oprogramowania	
10		Przegląd prototypu aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Pon, 07-01-08	Pią, 07-01-12	9	Dostawca oprogramowania	
11		Wersja testowa aplikacji administracyjnej	15 dn	Pon, 07-01-15	Pią, 07-02-02	10	Dostawca oprogramowania	
12		Testy aplikacji administracyjnej u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Pon, 07-02-05	Pią, 07-02-09	11	Dostawca oprogramowania	
13		Wersja końcowa aplikacji, wprowadzenie danych początkowych, wstępny odbiór	8 dn	Pon, 07-02-12	Śro, 07-02-21	12	Dostawca oprogramowania	
14		Przetarg2 - II etap	45 dn	Czw, 07-02-22	Śro, 07-04-25	4	Dostawca oprogramowania	
15		Aplikacje udostępniające zgromadzone dane, Szkolenia	45 dn	Czw, 07-02-22	Śro, 07-04-25		Dostawca oprogramowania	
16		Prototyp aplikacji Internetowej WWW, prototyp aplikacji kiosku	15 dn	Czw, 07-02-22	Śro, 07-03-14		Dostawca oprogramowania	
17		Przegląd prototypu aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag	5 dn	Czw, 07-03-15	Śro, 07-03-21	16	Dostawca oprogramowania	
18		Wersje testowe aplikacji Internetowej WWW i kiosku	15 dn	Czw, 07-03-22	Śro, 07-04-11	17	Dostawca oprogramowania	
19		Testy aplikacji u zamawiającego, zgłaszanie uwag, szkolenia	5 dn	Czw, 07-04-12	Śro, 07-04-18	18	Dostawca oprogramowania	
20		Wersje końcowe aplikacji, wstępny odbiór	5 dn	Czw, 07-04-19	Śro, 07-04-25	19	Dostawca oprogramowania	
21		Przetarg2 - III etap	26 dn	Czw, 07-04-26	Czw, 07-05-31	14	Dostawca oprogramowania	
22		Instalacja, testy, dokumentacja, odbiór ostateczny	26 dn	Czw, 07-04-26	Czw, 07-05-31		Dostawca oprogramowania	
23		Instalacja modemów GPRS i oprogramowania wioskach, testy	6 dn	Czw, 07-04-26	Czw, 07-05-03		Dostawca oprogramowania	
24		Testowa praca systemu, zgłaszanie uwag	5 dn	Pią, 07-05-04	Czw, 07-05-10	23	Dostawca oprogramowania	
25		Wprowadzanie poprawek	10 dn	Pią, 07-05-11	Czw, 07-05-24	24	Dostawca oprogramowania	
26		Odbiór ostateczny systemu SITBB, dostarczenie dokumentacji, licencji i gwarancji	5 dn	Pią, 07-05-25	Czw, 07-05-31	25	Dostawca oprogramowania	

Projekt: SITBB_Kioski
Data: Pon, 06-10-23

Zadanie




Punkt kontrolny



Zadania zewnętrzne



Podział



Podsumowanie



Zewnętrzne punkty kontrolne



Postęp





Podsumowanie projektu



Termin ostateczny



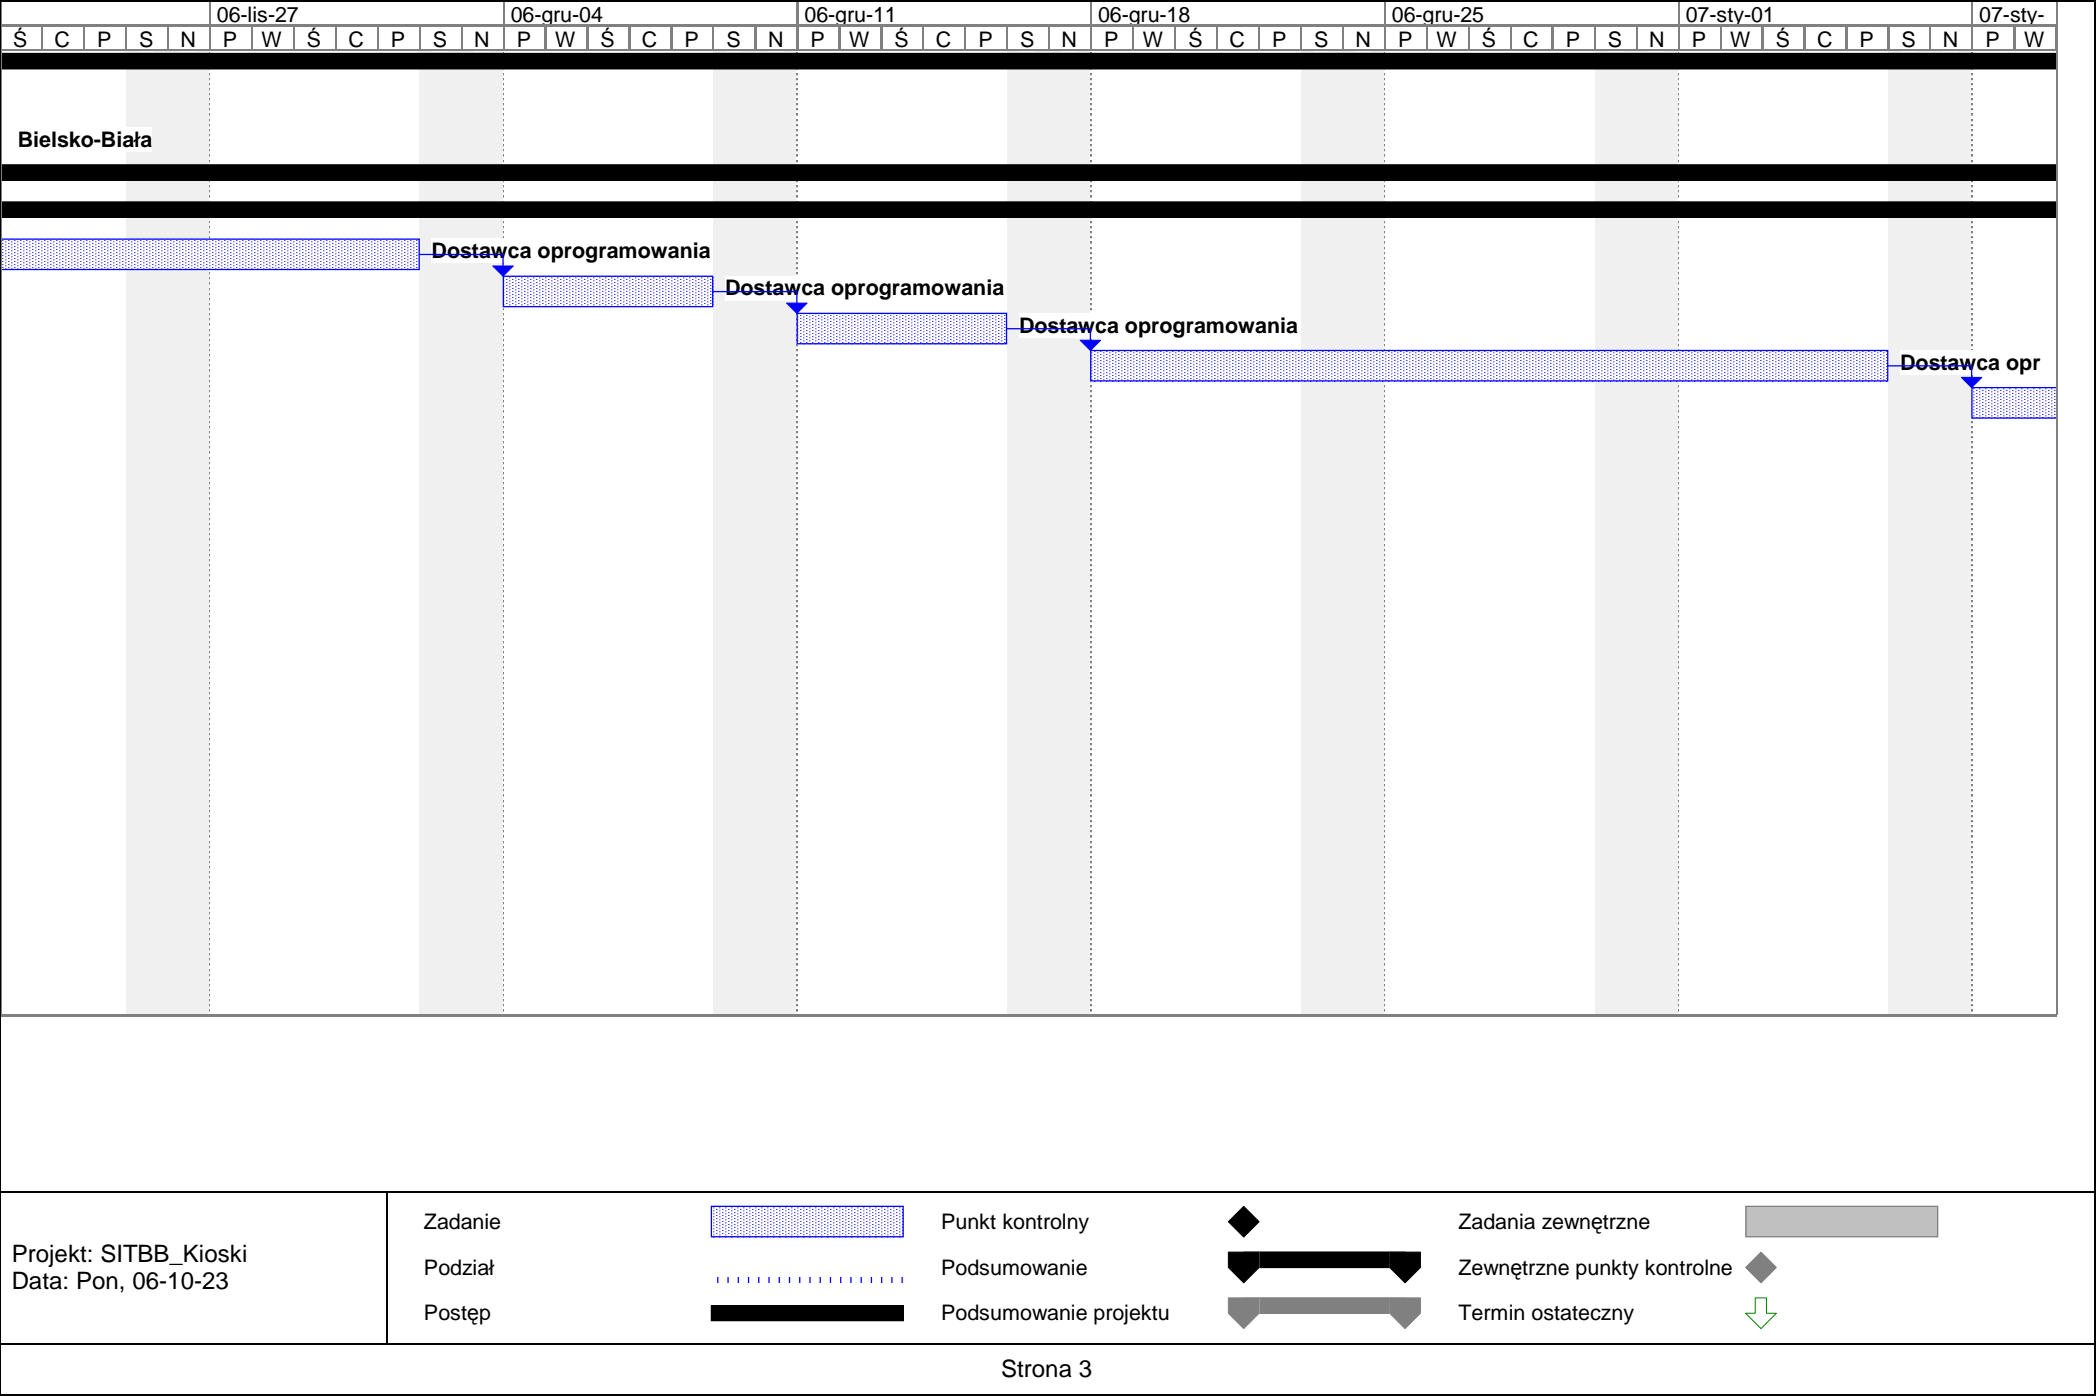

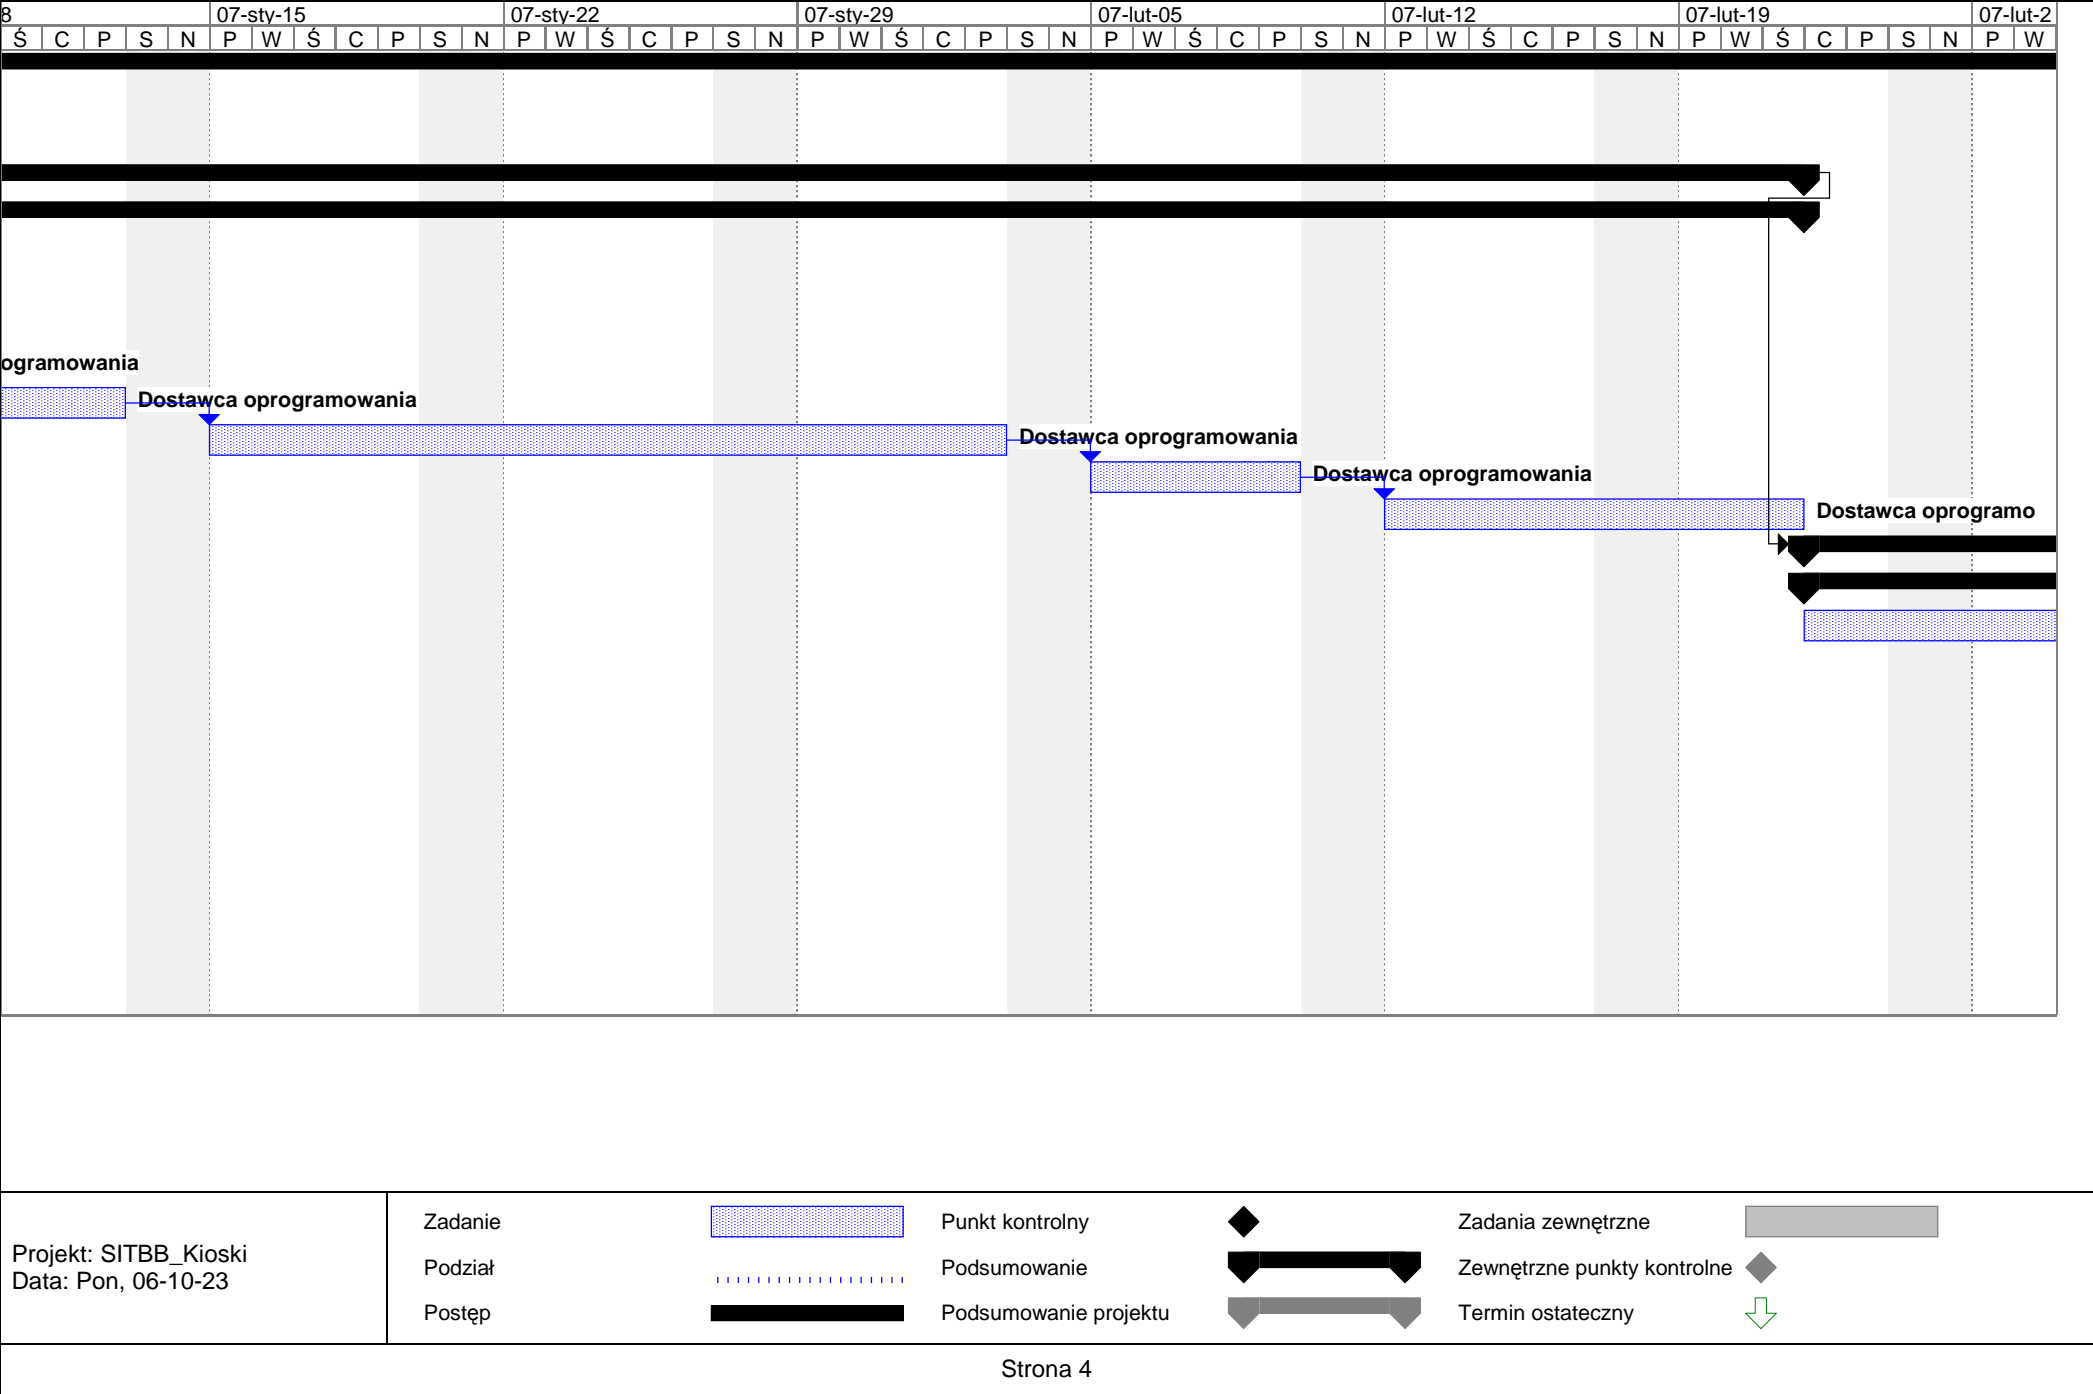

[illegible]
